別紙 2

様　　〔報告者〕 住所

氏名

エレベーター工事完了検査試験成績表

建物名				検査年月日	平成　年　月　日
設置場所	地名地番表示			検査官	様
用途・号機	用　号機	確認年月日	平成　年　月　日	立会者	
確認検査機関名				確認番号	第　号
製造番号		製造者名			

仕様

型式認定番号		型式認定年月日	平成　年　月　日			電源	3 φ AC　V　Hz
積載量	Kg（定員　名）	巻上機の位置				電動機	Kw　A
定格速度	m/min	綱車(D)	mmφ	D/d		緩衝器	かご　ばね・油入・緩衝材
運転操作方式		そらせ車	mmφ				おもり　ばね・油入・緩衝材
昇降行程	mm	主ロープ(d)	1：1	mmφ　本		非常止め装置	かご　早ぎき・次第ぎき
出入口 正面	階～　階　箇所		2：1				おもり　早ぎき・次第ぎき
出入口 背面	階～　階　箇所	ガイドレール	かご	kg/m		床合せ補正装置	有・無
出入口寸法	幅　高さ　mm		おもり	kg/m		車いす用	有・無
かご内法	間口　奥行　mm	戸の型式				トランク	有・無
かご天井高さ	mm	防犯窓	有・無			天井救出口	有・無
戸開走行保護装置（大臣認定番号）		号	認定番号照合確認			良・否	
遮煙扉　（大臣認定番号）		号	認定番号照合確認			良・否	

試験記録

絶縁抵抗	電源回路	MΩ	制御回路	MΩ	照明回路	MΩ	
	電動機主回路	MΩ	信号回路	MΩ	停電灯	良・否	
管制運転	地震時等管制運転装置	良・否			かご内照明装置	良・否	
調速機試験	過速スイッチ	かご　m/min	キャッチ	かご　m/min	非常止め試験	かご	良・否
		おもり　m/min		おもり　m/min		おもり	良・否
各部寸法	頂部すき間	mm　良・否	かご床先と出入口床先	mm　良・否	かごと緩衝器	mm	良・否
	頂部安全距離	mm　良・否	かご床先と昇降路壁	良・否	おもりと緩衝器	mm	良・否
	ピット深さ	mm　良・否	ﾏｼﾝﾋﾞｰﾑの掛かり代	良・否			

負荷試験		上昇							下降						
積載量	%	0	25	50	75	100	110		0	25	50	75	100	110	
(質量)	Kg														
電流	(A)														
速度	m/min														

負荷試験グラフ

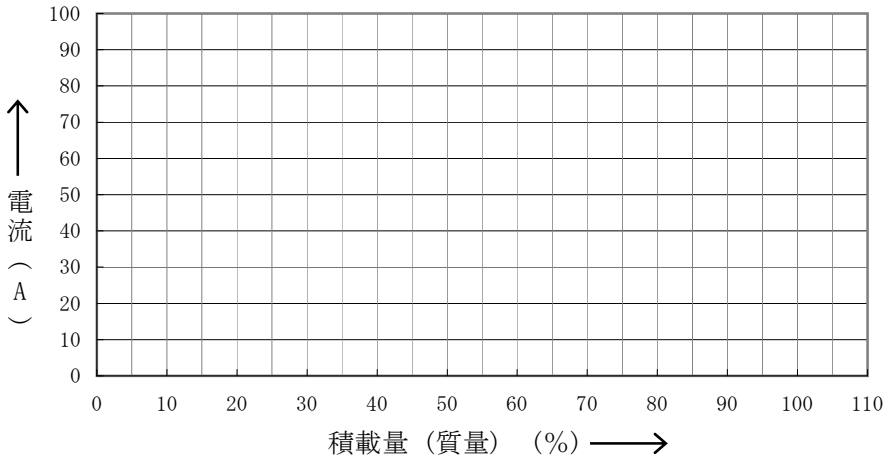

〔試験記録〕

- データー測定日　平成　年　月　日
- かごの平衡荷重　kg　%（良・否）
- はかり装置セット値　kg
- 扉閉鎖力　（150N以下）（良・否）
- 昇降路壁、囲い等の安全な構造（良・否）

〔その他管制運転の有無〕

- 火災時管制（有・無）
- 自家発管制（有・無）
- 停電時自動着床装置（有・無）

〔特記事項〕　＊特殊認定等を記載する

総合判定	良・否
